UNIVERSIDAD DE ORIENTE

Studium est via veritatis

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

SPRINT 1

Planificación y registro del sprint · del lunes 10 al domingo 16 de noviembre de 2026

INTEGRANTES	Hernández Coreas Lenin Alejandro — U20240830 Granados Amaya Carlos Alberto — U20240579 Hernández Coreas Bremond Antony — U20240827 Pacheco Araniva René Francisco — U20240844 Rodríguez Quintanilla Nelson René — U20240270 Guardado Ortez Kevin Bladimir — U20241103
CÁTEDRA	Aplicación de Técnicas Contables
DOCENTE	René Adalberto Gómez
FECHA	9 de noviembre de 2026

SAN MIGUEL, EL SALVADOR, CENTROAMÉRICA

ÍNDICE

1. Información general.....3
2. Objetivo del sprint (Sprint Goal).....3
3. Equipo Scrum.....3
4. Capacidad y pronóstico.....4
4.1 Distribución por área.....4
5. Sprint Backlog.....5
5.1 Historias comprometidas.....5
5.2 Tareas.....5
5.3 Tareas por integrante.....8
6. Plan de ejecución.....9
7. Eventos Scrum.....9
7.1 Formato del Daily Scrum.....9
8. Definición de listo y de terminado.....10
8.1 Definición de listo.....10
8.2 Definición de terminado.....10
9. Riesgos e impedimentos.....10
9.1 Registro de impedimentos.....11
10. Seguimiento.....11
10.1 Tablero.....11
10.2 Burndown planificado.....11
11. Incremento esperado.....12
12. Acuerdos de trabajo.....12
13. Sprint Review.....12
14. Sprint Retrospective.....13
15. Aprobación.....14

1. Información general

Este documento registra el sprint 1 del proyecto sistema contable web multiempresa conforme al marco Scrum: su objetivo, el Sprint Backlog con las tareas asignadas, la capacidad del equipo, los eventos, los riesgos y los registros de la revisión y la retrospectiva.

DATO	VALOR
Proyecto	Sistema contable web multiempresa (proyecto final de Aplicación de Técnicas Contables)
Sprint	Sprint 1 de 4
Fechas	Del lunes 10 al domingo 16 de noviembre de 2026
Duración	7 días (1 semana)
Product Owner	Pacheco Araniva René Francisco
Scrum Master	Granados Amaya Carlos Alberto
Developers	Los seis integrantes del equipo
Compromiso	19 historias de usuario, 80 puntos, 88 tareas, 146 horas estimadas
Repositorio	https://github.com/Carlos-Gnd/UNIVO-Sistema-Contable
Tablero	https://github.com/users/Carlos-Gnd/projects/9 (campo Sprint = Sprint 1)

2. Objetivo del sprint (Sprint Goal)

Tener el sistema publicado en internet, con inicio de sesión, empresas, sucursales, usuarios y permisos, el catálogo de cuentas y el registro y contabilización de partidas funcionando de punta a punta.

El objetivo se cumple si, al final del sprint, la demostración de la sección 11 puede ejecutarse completa en el ambiente publicado. Si durante el sprint surge trabajo que compromete el objetivo, el equipo renegocia el alcance con el Product Owner sin cambiar el objetivo.

3. Equipo Scrum

INTEGRANTE	ROL EN EL SPRINT	RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
Pacheco Araniva René Francisco	Product Owner y Developer	Aclarar criterios de aceptación, aceptar o rechazar historias; formularios de empresa, períodos y partidas
Granados Amaya Carlos Alberto	Scrum Master y Developer (DBA)	Facilitar eventos y eliminar impedimentos; modelo de datos, triggers, CI y núcleo de partidas

INTEGRANTE	ROL EN EL SPRINT	RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
Hernández Coreas Lenin Alejandro	Developer (backend)	API de empresas, sucursales, bitácora e importación; pruebas de permisos y triggers
Guardado Ortez Kevin Bladimir	Developer (backend)	Autenticación, usuarios, permisos, cuentas, períodos y despliegue de la API
Hernández Coreas Bremond Antony	Developer (frontend)	Layout, idiomas, sesión, usuarios, bitácora, importación y prueba E2E
Rodríguez Quintanilla Nelson René	Developer (frontend)	Tema, componentes base, inicio de sesión, selector de empresa, catálogo y despliegue web

4. Capacidad y pronóstico

La capacidad considera que los integrantes estudian otras materias: se estiman entre 26 y 32 horas efectivas por persona en la semana. El pronóstico se basa en la estimación de las tareas; al cerrar el sprint se registra la velocidad real para planificar el siguiente.

INTEGRANTE	CAPACIDAD (H)	TAREAS	ASIGNADO (H)	OCUPACIÓN
Granados Amaya Carlos Alberto	32	18	29	91 %
Pacheco Araniva René Francisco	26	11	19	73 %
Hernández Coreas Lenin Alejandro	28	18	27	96 %
Guardado Ortez Kevin Bladimir	28	16	26	93 %
Hernández Coreas Bremond Antony	26	11	22	85 %
Rodríguez Quintanilla Nelson René	26	14	23	88 %
Total	166	88	146	88 %

La ocupación se mantiene por debajo del 100 % para absorber revisiones de código, correcciones y reuniones. Pronóstico: 80 puntos.

4.1 Distribución por área

ÁREA	TAREAS	HORAS
DevOps	7	9
Frontend	32	59
Backend	28	45
QA	7	12
Documentación	3	3
Base de datos	11	18

5. Sprint Backlog

5.1 Historias comprometidas

ID	HISTORIA	PRIORIDAD	PTS	TAREAS	HORAS
HU-01	Monorepo y calidad de código	Debe	5	10	12
HU-02	Despliegue continuo	Debe	3	7	7
HU-03	Modelo de datos base	Debe	8	8	14
HU-04	Base de interfaz e idiomas	Debe	3	6	12
HU-05	Inicio de sesión	Debe	3	5	9
HU-06	Registro de empresas	Debe	5	6	10
HU-07	Sucursales	Debe	3	3	5
HU-08	Usuarios y roles	Debe	5	4	8
HU-09	Empresa y sucursal activa	Debe	3	3	5
HU-10	Control de permisos	Debe	5	5	10
HU-11	Consulta de bitácora	Debe	3	3	5
HU-15	Mantenimiento de cuentas	Debe	5	4	8
HU-16	Catálogo empresarial precargado	Debe	3	3	4
HU-17	Importación desde Excel	Debe	5	4	8
HU-18	Vista en árbol del catálogo	Debería	2	2	3
HU-19	Ejercicios y períodos	Debe	3	2	4
HU-20	Registro de partidas manuales	Debe	8	6	12
HU-21	Borradores y bandeja de pendientes	Debe	3	2	3
HU-22	Contabilización de partidas	Debe	5	5	7
	Total		80	88	146

Los criterios de aceptación de cada historia están en el documento Historias de usuario y en su issue de GitHub.

5.2 Tareas

Cada tarea es un issue de GitHub vinculado como sub-issue de su historia, asignado a su responsable y visible en el tablero con los campos Sprint, Responsable, Área y Horas.

ID	TAREA	RESPONSABLE	ÁREA	HORAS
HU-01 Monorepo y calidad de código				
S1-T01	Inicializar monorepo pnpm con apps/ y packages/	Carlos	DevOps	1
S1-T02	Crear apps/web con Vite, React y TypeScript estricto	Nelson	Frontend	1
S1-T03	Crear apps/api con NestJS y TypeScript estricto	Kevin	Backend	1
S1-T04	Crear packages/shared con Zod y exportación de tipos	Lenin	Backend	1
S1-T05	Configurar ESLint y Prettier compartidos	Lenin	DevOps	2

ID	TAREA	RESPONSABLE	ÁREA	HORAS
S1-T06	Configurar Vitest en los tres paquetes	Lenin	QA	1
S1-T07	Workflow de GitHub Actions: lint, pruebas y build	Carlos	DevOps	2
S1-T08	Proteger la rama main (PR y CI obligatorios)	Carlos	DevOps	1
S1-T09	Guía de contribución: ramas, commits y pull requests	René	Documentación	1
S1-T10	README con instalación local	René	Documentación	1
HU-02 Despliegue continuo				
S1-T11	Crear proyecto en Supabase y variables de entorno	Carlos	DevOps	1
S1-T12	Conectar Prisma a Supabase y primera migración	Carlos	Base de datos	1
S1-T13	Endpoint /health en la API	Kevin	Backend	1
S1-T14	Desplegar la API en Render	Kevin	DevOps	1
S1-T15	Desplegar la web en Vercel con la URL de la API	Nelson	DevOps	1
S1-T16	Mostrar la versión desplegada en el pie de la web	Nelson	Frontend	1
S1-T17	Documentar variables en .env.example	Kevin	Documentación	1
HU-03 Modelo de datos base				
S1-T18	Diagrama entidad-relación inicial	Carlos	Base de datos	2
S1-T19	Esquema: empresas, sucursales, usuarios y membresías	Carlos	Base de datos	2
S1-T20	Esquema: cuentas, ejercicios y períodos	Carlos	Base de datos	1
S1-T21	Esquema: partidas, detalle y correlativos	Carlos	Base de datos	2
S1-T22	Trigger: impedir contabilizar descuadradas o en período cerrado	Carlos	Base de datos	2
S1-T23	Tabla y trigger de bitácora inmutable	Carlos	Base de datos	2
S1-T24	Pruebas SQL de los triggers	Lenin	QA	2
S1-T25	Semilla con datos de prueba	Lenin	Base de datos	1
HU-04 Base de interfaz e idiomas				
S1-T26	Layout principal: menú lateral y encabezado	Bremond	Frontend	3
S1-T27	Diseño adaptable a tableta y celular	Bremond	Frontend	2
S1-T28	Tema: colores, tipografía y modo oscuro	Nelson	Frontend	2
S1-T29	Instalar componentes base de shadcn/ui	Nelson	Frontend	1
S1-T30	Configurar react-i18next con archivos es y en	Bremond	Frontend	1
S1-T31	Tabla reutilizable con paginación y filtros	Nelson	Frontend	3
HU-05 Inicio de sesión				
S1-T32	Pantalla de inicio de sesión	Nelson	Frontend	2
S1-T33	Pantallas de recuperación y cambio de contraseña	Nelson	Frontend	2
S1-T34	Cliente de Supabase Auth y manejo de sesión en la web	Bremond	Frontend	2
S1-T35	Guard de la API que verifica el JWT de Supabase	Kevin	Backend	2
S1-T36	Pruebas del guard de autenticación	Lenin	QA	1
HU-06 Registro de empresas				
S1-T37	Validadores de NIT y NRC en packages/shared	Lenin	Backend	1
S1-T38	API: crear y editar empresa	Lenin	Backend	2
S1-T39	Asignar al creador como administrador	Lenin	Backend	1
S1-T40	Subida del logotipo a Supabase Storage	Kevin	Backend	2
S1-T41	Formulario de empresa	René	Frontend	3
S1-T42	Mostrar el logotipo en el encabezado	René	Frontend	1
HU-07 Sucursales				

ID	TAREA	RESPONSABLE	ÁREA	HORAS
S1-T43	API de sucursales: crear, editar e inactivar	Lenin	Backend	2
S1-T44	Crear la casa matriz al registrar la empresa	Lenin	Backend	1
S1-T45	Pantalla de sucursales	René	Frontend	2
HU-08 Usuarios y roles				
S1-T46	API: invitar usuario por correo	Kevin	Backend	2
S1-T47	API: asignar rol y sucursales por empresa	Kevin	Backend	2
S1-T48	Pantalla de usuarios con invitación	Bremond	Frontend	2
S1-T49	Diálogo de asignación de rol y sucursales	Bremond	Frontend	2
HU-09 Empresa y sucursal activa				
S1-T50	Middleware de empresa activa en la API	Kevin	Backend	2
S1-T51	Selector de empresa y sucursal en el encabezado	Nelson	Frontend	2
S1-T52	Recordar la última selección	Nelson	Frontend	1
HU-10 Control de permisos				
S1-T53	Tablas y semilla de la matriz de permisos	Carlos	Base de datos	2
S1-T54	Decorador @Permiso y guard en NestJS	Kevin	Backend	2
S1-T55	Endpoint de permisos del usuario actual	Kevin	Backend	1
S1-T56	Hook usePermiso para ocultar opciones	René	Frontend	2
S1-T57	Pruebas por rol: casos permitidos y denegados	Lenin	QA	3
HU-11 Consulta de bitácora				
S1-T58	API de bitácora con filtros y paginación	Lenin	Backend	2
S1-T59	Pantalla de bitácora con filtros	Bremond	Frontend	2
S1-T60	Exportación de la bitácora a Excel	Bremond	Frontend	1
HU-15 Mantenimiento de cuentas				
S1-T61	Reglas de código jerárquico y naturaleza, con pruebas	Kevin	Backend	2
S1-T62	API de cuentas: crear, editar e inactivar	Kevin	Backend	2
S1-T63	Formulario de cuenta	Nelson	Frontend	2
S1-T64	Listado de cuentas	Nelson	Frontend	2
HU-16 Catálogo empresarial precargado				
S1-T65	Catálogo empresarial para persona natural	Carlos	Base de datos	2
S1-T66	Variante del catálogo para sociedad	Carlos	Base de datos	1
S1-T67	Copiar el catálogo al crear la empresa	Lenin	Backend	1
HU-17 Importación desde Excel				
S1-T68	Plantillas de Excel descargables	Lenin	Backend	1
S1-T69	Lectura y validación del Excel con ExcelJS	Lenin	Backend	2
S1-T70	Generar la partida de apertura en borrador	Kevin	Backend	2
S1-T71	Pantalla de carga con reporte de errores	Bremond	Frontend	3
HU-18 Vista en árbol del catálogo				
S1-T72	Vista en árbol expandible	Nelson	Frontend	2
S1-T73	Búsqueda por código o nombre	Nelson	Frontend	1
HU-19 Ejercicios y períodos				
S1-T74	API de ejercicios con generación de 12 períodos	Kevin	Backend	2
S1-T75	Pantalla de ejercicios y períodos	René	Frontend	2
HU-20 Registro de partidas manuales				
S1-T76	Reglas de dominio: cuadre y cuentas válidas con decimal.js	Carlos	Backend	2

ID	TAREA	RESPONSABLE	ÁREA	HORAS
S1-T77	Pruebas unitarias del dominio de partidas	Carlos	QA	2
S1-T78	API: crear y editar partida en borrador	Lenin	Backend	2
S1-T79	Formulario: cabecera de la partida	René	Frontend	2
S1-T80	Formulario: detalle dinámico con búsqueda de cuentas	René	Frontend	3
S1-T81	Totales de debe y haber en vivo	René	Frontend	1
HU-21 Borradores y bandeja de pendientes				
S1-T82	API: bandeja de borradores con su diferencia	Kevin	Backend	1
S1-T83	Pantalla de bandeja de pendientes	Bremond	Frontend	2
HU-22 Contabilización de partidas				
S1-T84	Caso de uso contabilizar con correlativo bloqueado	Carlos	Backend	2
S1-T85	Contabilización por lote	Carlos	Backend	1
S1-T86	Botones de contabilizar individual y por lote	René	Frontend	1
S1-T87	Prueba de concurrencia de correlativos	Lenin	QA	1
S1-T88	Prueba E2E: registrar y contabilizar una partida	Bremond	QA	2

5.3 Tareas por integrante

Granados Amaya Carlos Alberto (18 tareas, 29 h): S1-T01, S1-T07, S1-T08, S1-T11, S1-T12, S1-T18, S1-T19, S1-T20, S1-T21, S1-T22, S1-T23, S1-T53, S1-T65, S1-T66, S1-T76, S1-T77, S1-T84, S1-T85

Pacheco Araniva René Francisco (11 tareas, 19 h): S1-T09, S1-T10, S1-T41, S1-T42, S1-T45, S1-T56, S1-T75, S1-T79, S1-T80, S1-T81, S1-T86

Hernández Coreas Lenin Alejandro (18 tareas, 27 h): S1-T04, S1-T05, S1-T06, S1-T24, S1-T25, S1-T36, S1-T37, S1-T38, S1-T39, S1-T43, S1-T44, S1-T57, S1-T58, S1-T67, S1-T68, S1-T69, S1-T78, S1-T87

Guardado Ortez Kevin Bladimir (16 tareas, 26 h): S1-T03, S1-T13, S1-T14, S1-T17, S1-T35, S1-T40, S1-T46, S1-T47, S1-T50, S1-T54, S1-T55, S1-T61, S1-T62, S1-T70, S1-T74, S1-T82

Hernández Coreas Bremond Antony (11 tareas, 22 h): S1-T26, S1-T27, S1-T30, S1-T34, S1-T48, S1-T49, S1-T59, S1-T60, S1-T71, S1-T83, S1-T88

Rodríguez Quintanilla Nelson René (14 tareas, 23 h): S1-T02, S1-T15, S1-T16, S1-T28, S1-T29, S1-T31, S1-T32, S1-T33, S1-T51, S1-T52, S1-T63, S1-T64, S1-T72, S1-T73

6. Plan de ejecución

Orden sugerido para respetar las dependencias: la base técnica y el modelo de datos desbloquean al resto del equipo.

DÍA	ENFOQUE	HISTORIAS
Lunes 10	Planificación. Monorepo, apps base, Supabase y despliegue inicial.	HU-01, HU-02
Martes 11	Modelo de datos y triggers; layout e idiomas en la interfaz.	HU-03, HU-04
Miércoles 12	Inicio de sesión, empresas, sucursales y catálogo precargado.	HU-05, HU-06, HU-07, HU-16
Jueves 13	Usuarios, empresa activa, permisos, ejercicios y cuentas.	HU-08, HU-09, HU-10, HU-19, HU-15
Viernes 14	Partidas, borradores, árbol del catálogo e importación.	HU-20, HU-21, HU-18, HU-17
Sábado 15	Contabilización, bitácora y pruebas de punta a punta.	HU-22, HU-11
Domingo 16	Corrección de errores, revisión del sprint y retrospectiva.	—

7. Eventos Scrum

EVENTO	CUÁNDO	DURACIÓN	PARTICIPANTES	PROPÓSITO
Sprint Planning	Lunes 10 de noviembre	1 h 30 min	Todo el equipo	Confirmar el objetivo, revisar las historias comprometidas, dividirlas en tareas y asignarlas.
Daily Scrum	Lunes a sábado, 8:00 p. m.	15 min	Developers (facilita el SM)	Qué hice ayer, qué haré hoy y qué me bloquea. Por llamada o por mensaje en el grupo.
Sprint Review	Domingo 16 de noviembre	1 h	Equipo; docente invitado	Demostración del incremento publicado; el PO acepta o rechaza cada historia y se actualiza el backlog.
Sprint Retrospective	Domingo 16 de noviembre	45 min	Todo el equipo	Qué funcionó, qué no y qué acciones concretas se aplican en el sprint 2.
Refinamiento del backlog	Jueves 13 de noviembre	45 min	PO, SM y Developers	Revisar y estimar las historias del sprint 2 para que cumplan la definición de listo.

7.1 Formato del Daily Scrum

Cada integrante responde en el grupo, antes de las 8:00 p. m., estas tres preguntas sobre sus tareas del tablero:

- ¿Qué terminé desde el último daily?
- ¿Qué voy a hacer hasta el próximo?
- ¿Qué me impide avanzar?

El Scrum Master revisa los bloqueos y los atiende el mismo día.

8. Definición de listo y de terminado

8.1 Definición de listo

- La historia sigue el formato «Como… quiero… para…».
- Tiene criterios de aceptación verificables.
- Está estimada en puntos por el equipo.
- Sus dependencias están terminadas o planificadas en el mismo sprint.

8.2 Definición de terminado

- Cumple todos sus criterios de aceptación.
- El código está en main mediante pull request revisado por otro integrante.
- Lint y pruebas pasan en GitHub Actions.
- La funcionalidad está publicada y se probó en el ambiente en línea.
- Respeta la matriz de permisos.
- Los textos de la interfaz están en los archivos de idioma.
- El Product Owner aceptó la historia en la Sprint Review.

9. Riesgos e impedimentos

RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	MITIGACIÓN
El modelo de datos se retrasa y bloquea a todo el equipo	Media	Alto	Carlos lo termina el martes; mientras tanto el frontend avanza con datos simulados.
Integrantes nuevos en NestJS o Prisma	Alta	Medio	Plantillas de módulo de referencia y uso de asistentes de código con revisión en PR.
Render tarda en despertar o falla el despliegue	Media	Medio	Desplegar desde el lunes y probar en línea cada día, no solo al final.
Errores de cálculo en los montos	Baja	Alto	decimal.js en todo cálculo, NUMERIC en la base y pruebas unitarias del dominio.
Carga académica de otras materias	Alta	Medio	Daily diario para detectar atrasos; redistribuir tareas a mitad de semana.
Invitaciones al repositorio sin aceptar	Media	Bajo	Aceptarlas el lunes antes de la planificación.

9.1 Registro de impedimentos

Se completa durante el sprint.


FECHA	IMPEDIMENTO	RESPONSABLE	RESOLUCIÓN

10. Seguimiento

10.1 Tablero

El avance se sigue en el tablero de GitHub Projects con las columnas Todo, In Progress y Done. Una tarea pasa a Done cuando su pull request está fusionado; una historia, cuando todas sus tareas están terminadas y cumple la definición de terminado.

10.2 Burndown planificado

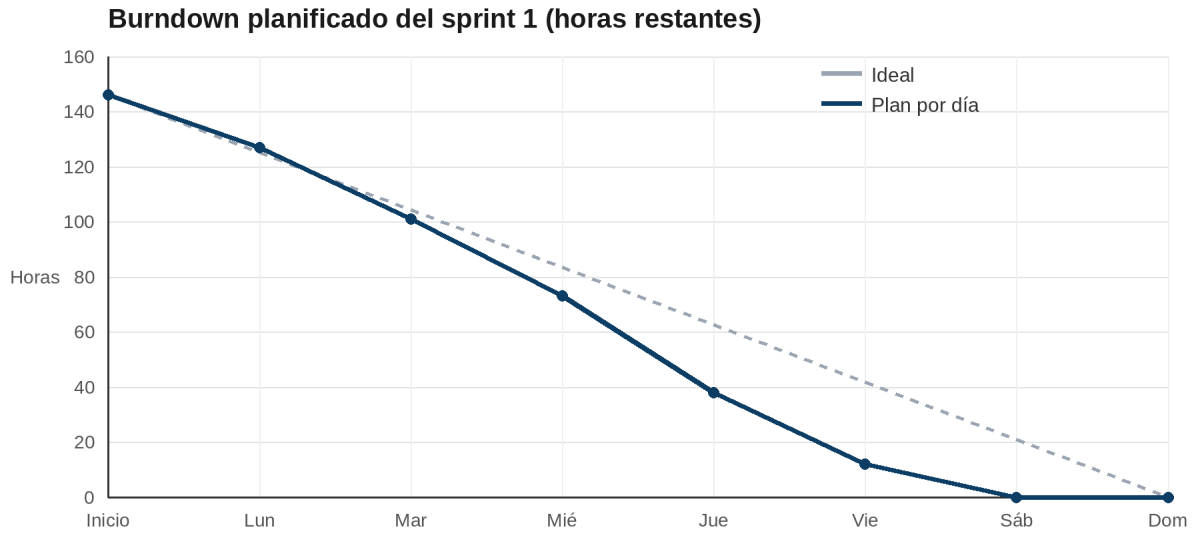

Cada noche, el Scrum Master registra las horas restantes reales en la tabla para compararlas con el plan.

DÍA	INICIO	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
Ideal	146	125	104	83	63	42	21	0

DÍA	INICIO	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
Plan	146	127	101	73	38	12	0	0
Real								

11. Incremento esperado

Incremento: Primera versión publicada: acceso seguro, organización, catálogo y partidas.

Guion de demostración para la Sprint Review:

1. Abrir el sistema publicado en internet e iniciar sesión.

2. Registrar la empresa CheroPhonex con su logotipo y su casa matriz.

3. Invitar a un auxiliar y a un contador con sus roles.

4. Mostrar el catálogo precargado en árbol e importar saldos iniciales desde Excel.

5. Como auxiliar, registrar una partida descuadrada y verla en la bandeja de pendientes.

6. Corregirla; como contador, contabilizarla y ver su número correlativo.

7. Comprobar que el auxiliar no puede contabilizar y revisar el cambio en la bitácora.

12. Acuerdos de trabajo

- Una rama por historia: feat/HU-XX-descripcion; nadie hace push directo a main.
- Cada pull request lo revisa otro integrante antes de 24 horas.
- Las tareas se mueven en el tablero el mismo día: Todo → In Progress → Done.
- Un bloqueo de más de medio día se avisa en el grupo sin esperar al daily.
- Los commits siguen el formato feat(dominio): descripción (HU-XX).
- El código generado con asistentes se revisa y se prueba igual que el escrito a mano.

13. Sprint Review

Se completa al cierre del sprint.

ID	HISTORIA	PTS	¿ACEPTADA?	OBSERVACIONES
HU-01	Monorepo y calidad de código	5		
HU-02	Despliegue continuo	3		
HU-03	Modelo de datos base	8		
HU-04	Base de interfaz e idiomas	3		
HU-05	Inicio de sesión	3		
HU-06	Registro de empresas	5		
HU-07	Sucursales	3		
HU-08	Usuarios y roles	5		
HU-09	Empresa y sucursal activa	3		
HU-10	Control de permisos	5		
HU-11	Consulta de bitácora	3		
HU-15	Mantenimiento de cuentas	5		
HU-16	Catálogo empresarial precargado	3		
HU-17	Importación desde Excel	5		
HU-18	Vista en árbol del catálogo	2		
HU-19	Ejercicios y períodos	3		
HU-20	Registro de partidas manuales	8		
HU-21	Borradores y bandeja de pendientes	3		
HU-22	Contabilización de partidas	5		

INDICADOR	VALOR
Puntos comprometidos	80
Puntos terminados (velocidad)	
Historias terminadas	de 19
Horas estimadas / reales	146 /
Retroalimentación del docente o invitados	
Cambios al Product Backlog	

14. Sprint Retrospective

Se completa al cierre del sprint.

¿QUÉ SALIÓ BIEN?	¿QUÉ SE PUEDE MEJORAR?	ACCIONES PARA EL SIGUIENTE SPRINT

15. Aprobación

El Product Owner y el Scrum Master aprueban la planificación de este sprint.

ROL	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Product Owner	Pacheco Araniva René Francisco		
Scrum Master	Granados Amaya Carlos Alberto		
